	<b><u>PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA</u></b>		<b>Rev.</b> 01	<b>Página</b> 1/8	
	<b>Empreitada:</b> "Requalificação do Centro Cívico - Nogueira da Regedoura"			PSS.13.01	
	<b>Dono da Obra:</b> Município de Santa Maria da Feira		<b>Fiscalização:</b> Município de Santa Maria da Feira		
	<b>Projetista:</b> Município de Santa Maria da Feira		<b>Empreiteiro:</b> DIZconstrução Lda.		

**Intervenção: Centro Cívico - Nogueira da Regedoura**

**Coordenadas do Local de Intervenção:** 41.006245, -8.589087

**Trabalhos a realizar:** Requalificação do Centro Cívico – Nogueira da Regedoura

**Prazo para a execução dos trabalhos:** 270 dias

**Início dos trabalhos:** 26/06/2026

**Conclusão:** 26/02/2027

A Requalificação do Centro Cívico de Nogueira da Regedoura, será dividido em três fases.

**1.ª Fase: Rua Bernardino Pereira, incluindo as interseções com o Largo do Arraial, Rua Cobaixa e Rua Joaquim Domingues Maia.**

**2.ª Fase: Avenida São Cristóvão, incluindo as interseções com a Rua da Pitança, Rua da Portela, Travessa da Portela e Rua Senhora da Hora.**

**3.ª Fase: Avenida São Cristóvão, incluindo as interseções com a Rua da Pitança, Largo do Cruzeiro, Rua de Palmas, Rua Souto do Mato e Avenida da Fábrica.**

Para a execução dos trabalhos, será necessário proceder **ao corte total do trânsito** em todas as fases da empreitada.


Será implementado um plano de sinalização temporária, destinado a assegurar a adequada informação e orientação de condutores e peões relativamente à existência de trabalhos em curso.

Toda a área de intervenção será devidamente delimitada e resguardada através da colocação de painéis de rede tipo Bekaert's, cones de sinalização e balizas do tipo PMP, garantindo assim as necessárias condições de segurança para trabalhadores, residentes e utilizadores da via pública.


A sinalização temporária será instalada a intervalos regulares de 30 metros, podendo essa distância ser reduzida para um mínimo de 20 metros, sempre que as condições locais ou o avanço dos trabalhos o justifiquem.


Será ainda instalada sinalização temporária específica para o encaminhamento dos peões para os percursos alternativos a adotar durante a execução dos trabalhos, assegurando adequadas condições de circulação, acessibilidade e segurança ao longo de todo o percurso pedonal provisório, conforme indicado na planta apresentada seguidamente.




	<b>PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA</b>		Rev. 01	Página 2/8	
	Empreitada: "Requalificação do Centro Cívico - Nogueira da Regedoura"			PSS.13.01	
	Dono da Obra: Município de Santa Maria da Feira		Fiscalização: Município de Santa Maria da Feira		
	Projetista: Município de Santa Maria da Feira		Empreiteiro: DIZconstrução Lda.		

### Localização da Intervenção: Centro Cívico – Nogueira da Regedoura

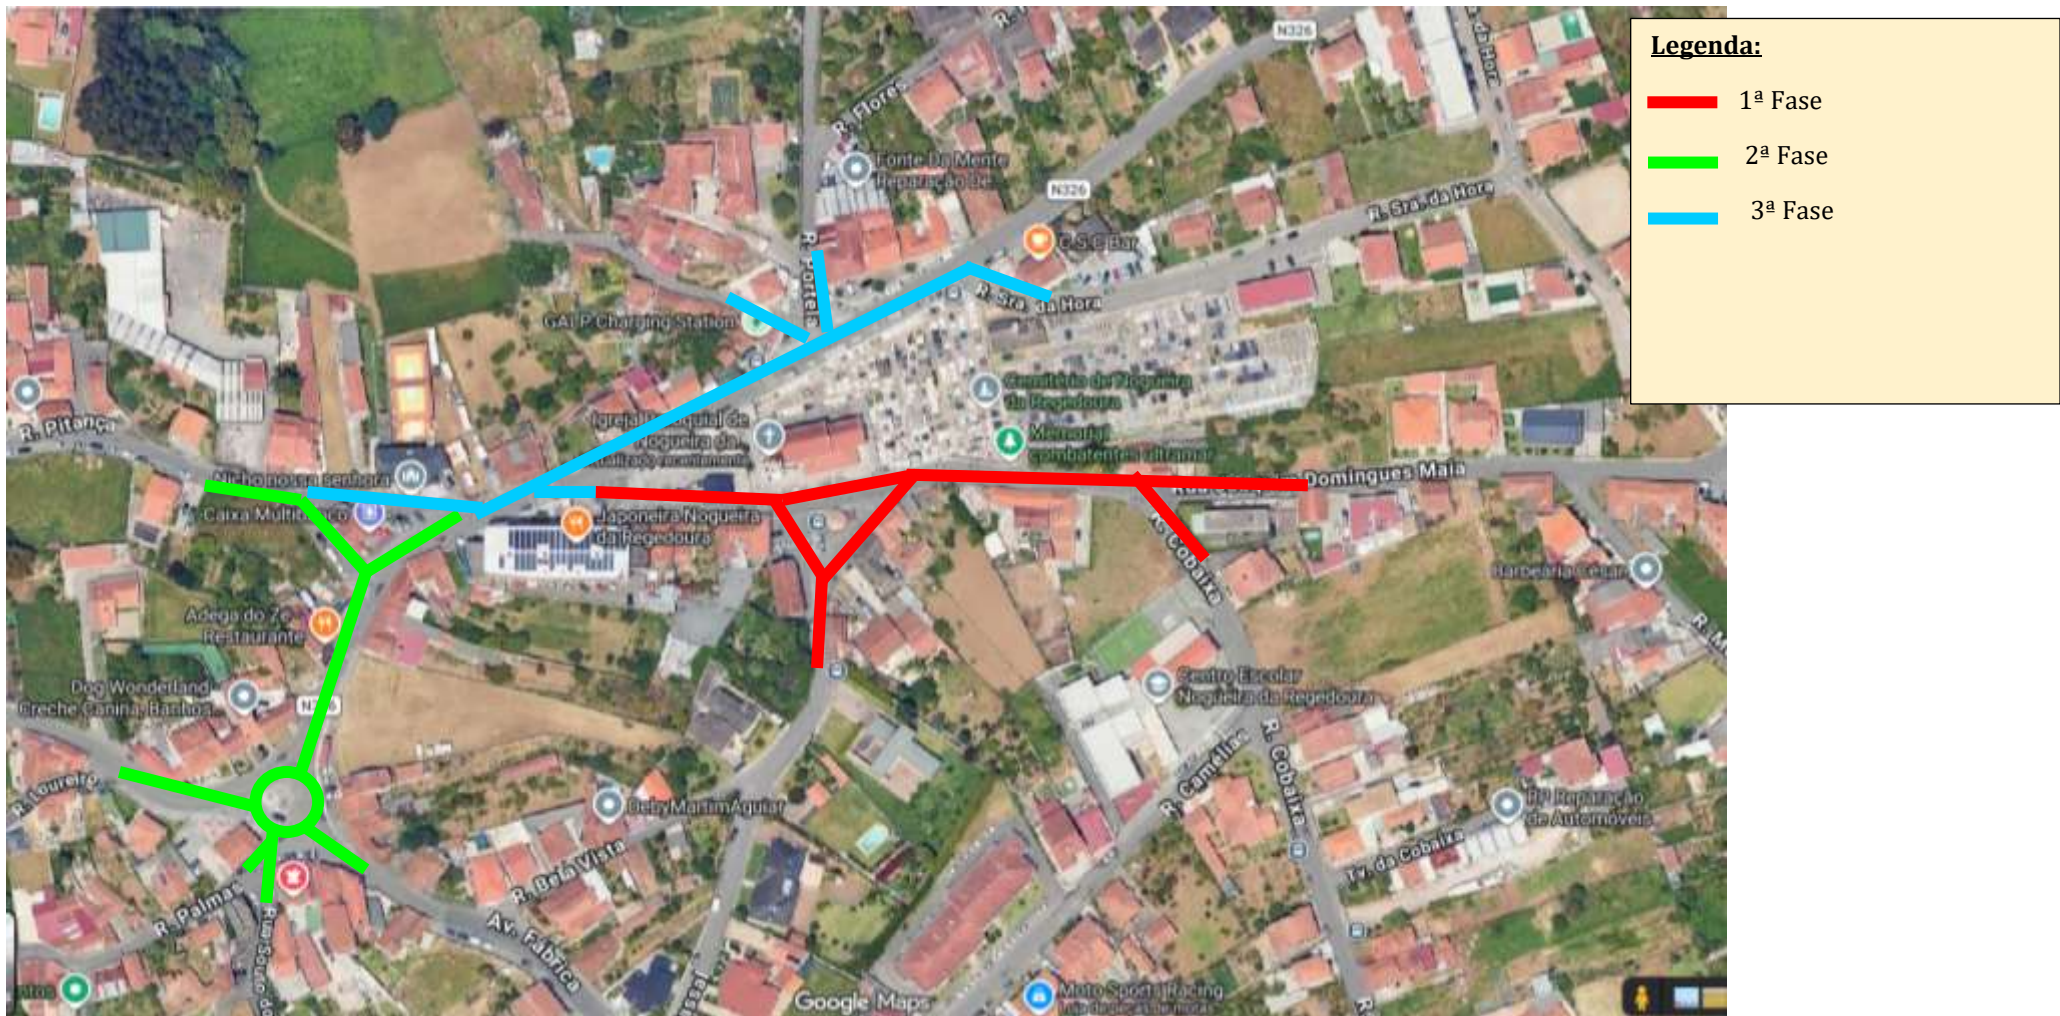


	<b>PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA</b>		<b>Rev.</b> 01	<b>Página</b> 3/8	
	Empreitada: "Requalificação do Centro Cívico - Nogueira da Regedoura"			PSS.13.01	
	Dono da Obra: Município de Santa Maria da Feira		Fiscalização: Município de Santa Maria da Feira		
	Projetista: Município de Santa Maria da Feira		Empreiteiro: DIZconstrução Lda.		

### Planta de sinalização a implementar: Rua Bernardino Pereira - 1ª Fase

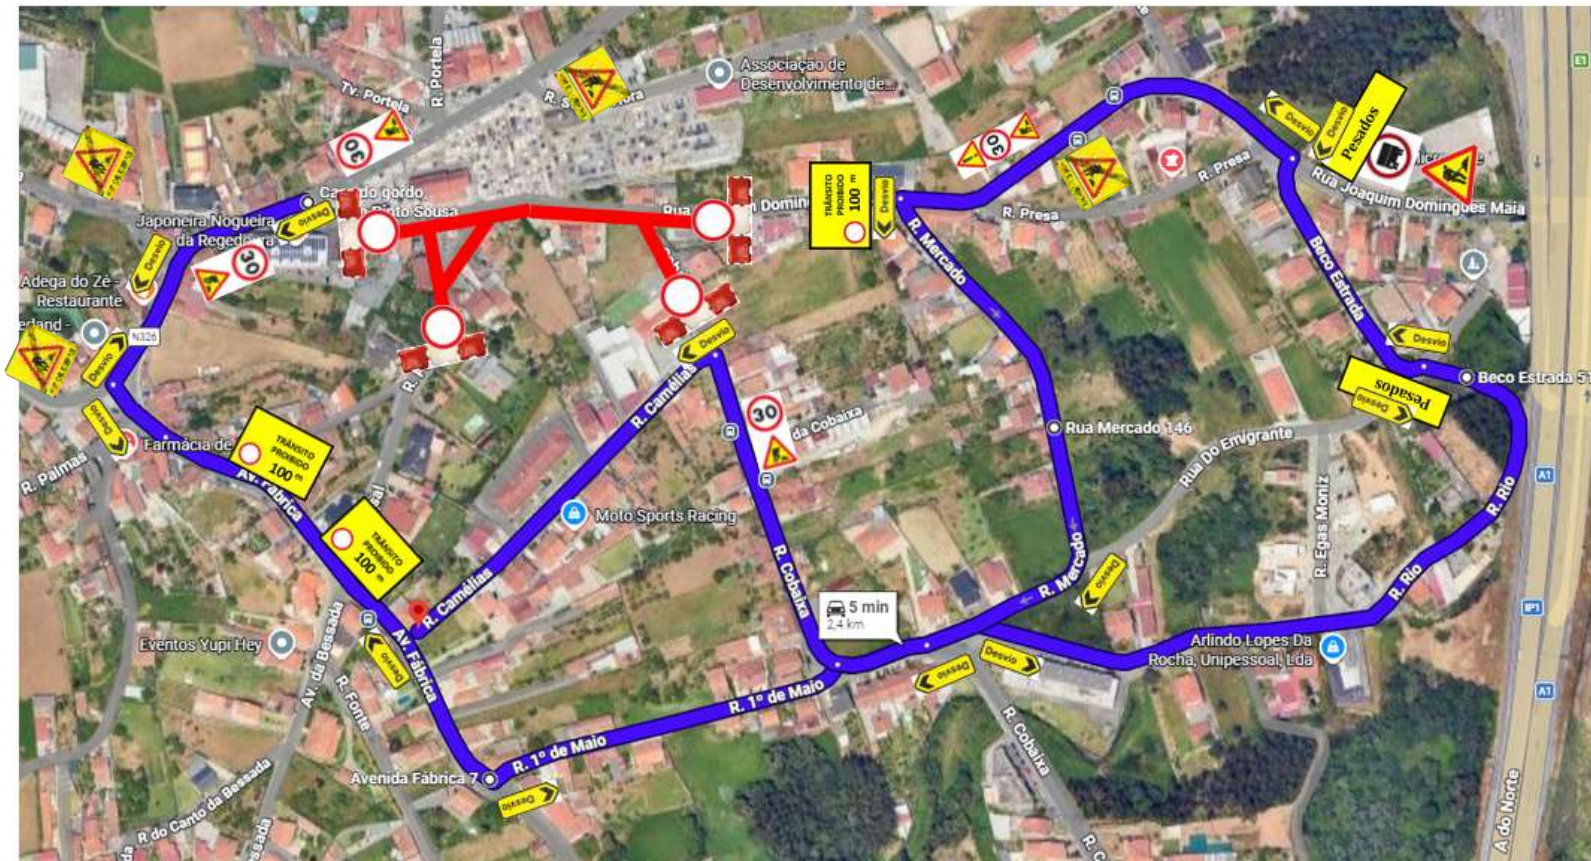



LEGENDA:	
	C2 - Trânsito Proibido
	C3B - Trânsito Proibido a Veículos Pesados
	C13 - Proibição de exceder velocidade máxima de 30 Km/h
	A23 - Trabalhos na Via
	AT15 - Outros Perigos
	ST8a - Desvio de itinerário à esquerda
	ST8a - Desvio de itinerário à direita
	ST - Início de Obras
	ST14 - Fim de Obras
	ET10 - Perfil Móvel Plástico
	Trânsito proibido a 100 m

	<b><u>PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA</u></b>		<b>Rev.</b> 01	<b>Página</b> 4/8	
	Empreitada: "Requalificação do Centro Cívico - Nogueira da Regedoura"			PSS.13.01	
	Dono da Obra: Município de Santa Maria da Feira		Fiscalização: Município de Santa Maria da Feira		
	Projetista: Município de Santa Maria da Feira		Empreiteiro: DIZconstrução Lda.		

### Planta de sinalização a implementar: Rua Bernardino Pereira - 1ª Fase

**Legenda:**

 Corte total de circulação automóvel

 Percurso alternativo

**Data de Início: 26/06/2026**

**Data de Término: 26/02/2027**

**Desvio de trânsito**

- Av. São Cristóvão
- Av. da Fábrica
- R. 1º de Maio
- R. do Rio
- Beco Estrada
- R. Joaquim Domingues Maia
- R. Mercado


**Desvio Veículos Pesados e Autocarros:**

**O trânsito de veículos pesados e Autocarros proveniente da Rua Joaquim Domingues Maia será desviado:**

- R. Beco da Estrada
- R. Rio
- R. das Camélias
- Av. Fábrica
- Av. São Cristóvão.


**Nota:**

- Para a realização destes trabalhos, a **circulação automóvel estará interdita**.
- Será colocada sinalização temporária a alertar todos os utentes nas vias de acesso ao troço que será intervencionado.
- Nas restantes ruas, serão colocadas as placas de Desvio a sinalizar o percurso alternativo.
- Será delimitação e sinalizado de um caminho para a circulação de peões.
- A sinalização temporária será colocada de 50 em 50 metros, ou reduzida até um mínimo de 30 m caso necessário.

	<b>PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA</b>		<b>Rev.</b> 01	<b>Página</b> 5/8	
	Empreitada: "Requalificação do Centro Cívico - Nogueira da Regedoura"			PSS.13.01	
	Dono da Obra: Município de Santa Maria da Feira		Fiscalização: Município de Santa Maria da Feira		
	Projetista: Município de Santa Maria da Feira		Empreiteiro: DIZconstrução Lda.		


### Planta de sinalização a implementar: Av. São Cristóvão - 2ª Fase




	<b><u>PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA</u></b>		<b>Rev.</b> 01	<b>Página</b> 6/8	
	Empreitada: "Requalificação do Centro Cívico - Nogueira da Regedoura"			PSS.13.01	
	Dono da Obra: Município de Santa Maria da Feira		Fiscalização: Município de Santa Maria da Feira		
	Projetista: Município de Santa Maria da Feira		Empreiteiro: DIZconstrução Lda.		

### Planta de sinalização a implementar: Av. São Cristóvão - 2ª Fase

**Legenda:**

 Corte total de circulação automóvel

 Percurso alternativo


**Data de Início: 01/06/2026**

**Data de Término: 26/02/2026**

**Desvio de trânsito**

- R. Pitança
- R. Reservatórios
- R. Barreiro
- Av. São Cristóvão
- Av. Tapadinho
- Av. da Bessada
- R. Passal
- Largo Arraial
- R. Bernardino Pereira
- Av. São Cristóvão


- Para a realização destes trabalhos, a **circulação automóvel estará interdita**.
- Será colocada sinalização temporária a alertar todos os utentes nas vias de acesso ao troço que será intervencionado.
- Nas restantes ruas, serão colocadas as placas de Desvio a sinalizar o percurso alternativo.
- Será delimitação e sinalizado de um caminho para a circulação de peões.
- A sinalização temporária será colocada de 50 em 50 metros, ou reduzida até um mínimo de 30 m caso necessário.

	<b>PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA</b>		<b>Rev.</b> 01	<b>Página</b> 7/8	
	Empreitada: "Requalificação do Centro Cívico - Nogueira da Regedoura"			PSS.13.01	
	Dono da Obra: Município de Santa Maria da Feira		Fiscalização: Município de Santa Maria da Feira		
	Projetista: Município de Santa Maria da Feira		Empreiteiro: DIZconstrução Lda.		

### Planta de sinalização a implementar: Av. São Cristóvão - 3ª Fase



LEGENDA:	
	C2 - Trânsito Proibido
	C13 - Proibição de exceder velocidade máxima de 30 Km/h
	A23 - Trabalhos na Via
	AT15 - Outros Perigos
	ST8a - Desvio de itinerário à esquerda
	ST8a - Desvio de itinerário à direita
	ST - Início de Obras
	ST14 - Fim de Obras
	ET10 - Perfil Móvel Plástico
	Trânsito proibido a X m

	<b><u>PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA</u></b>		<b>Rev.</b> 01	<b>Página</b> 8/8	
	Empreitada: "Requalificação do Centro Cívico - Nogueira da Regedoura"			PSS.13.01	
	Dono da Obra: Município de Santa Maria da Feira		Fiscalização: Município de Santa Maria da Feira		
	Projetista: Município de Santa Maria da Feira		Empreiteiro: DIZconstrução Lda.		

### Planta de sinalização a implementar: Av. São Cristóvão - 3ª Fase

**Legenda:**

█ Corte total de circulação automóvel

█ Percurso alternativo

**Data de Início: 01/06/2026**

**Data de Término: 26/02/2027**

**Desvio de trânsito**

- R. das Flores
- R. Regedoura
- Av. São Cristóvão
- R. Barra
- R. Joaquim Domingues Maia
- R. Passal
- Av. São Cristóvão
- R. do Barreiro
- R. Reservatórios
- R. Pitança
- R. Jacinta
- R. Portela

- Para a realização destes trabalhos, a **circulação automóvel estará interdita**.
- Será colocada sinalização temporária a alertar todos os utentes nas vias de acesso ao troço que será intervencionado.
- Nas restantes ruas, serão colocadas as placas de Desvio a sinalizar o percurso alternativo.
- Será delimitação e sinalizado de um caminho para a circulação de peões.
- A sinalização temporária será colocada de 50 em 50 metros, ou reduzida até um mínimo de 30 m caso necessário.

